COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

Provincia di Rovigo

PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO

per lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile nel Comune di Giacciano con Baruchella - località Baruchella -.

TAVOLA:

9

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:

Il Tecnico Incaricato:

Cappellari Geom. Francesco
Geometri e Geometri Laureati di Rovigo
Iscrizione Albo N. 865
Geometra Francesco Cappellari

Badia Polesine Febbraio 2022

Il Responsabile dell'area tecnica:

STUDIO TECNICO CAPPELLARI GEOM. FRANCESCO
Riviera Pace n. 141/1 Badia Polesine (Ro) Tel. 0425/590664 Fax 0425/52604 e-mail: studiocappellari.bp@gmail.com

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Amministrazione Comunale di Giacciano con Baruchella
PIAZZALE MARCONI, 1 – GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) –

ID	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA
1	CONSEGNA LAVORI	1g
2	OPERE PROVVISIONALI / BOX CANTIERE	3g
3	DEMOLIZIONE MANUFATTI / RECINZIONI	6g
4	MESSA IN QUOTA O SPOSTAMENTO POZZETTI E MANUFATTI TECNOLOGICI	5g
5	RIFACIMENTO RECINZIONI / SGRONDO ACQUE PIOVANE	23g
6	SCAVO CASSONETTO STRADALE / RIEMPIMENTO RILEVATI TERRA VEGETALE	30g
7	FORMAZIONE DI SOTTOFONDI PISTA CICLABILE	25g
8	FORNITURA E POSA CORDONATE PREFABBRICATE	25g
9	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS PER SOTTOFONDO PISTA CICLABILE	8g
10	FORNITURA E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO	4g
11	SCAVO E RINTERRO OPERE ELETTRICHE	6g
12	TUBAZIONI RIGIDE / LINEE CAVO	15g
13	FORNITURA E POSA PUNTI LUCE / COLLEGAMENTI LINEE ELETTRICHE	8g
14	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	5g
15	FORNITURA E POSA PARAPETTI STRADALI E DISSUASORI	8g
16	FINITURE ED OPERE DI PULIZIA / DISCARICA	5g
17	SMOBILIZZO CANTIERE	3g

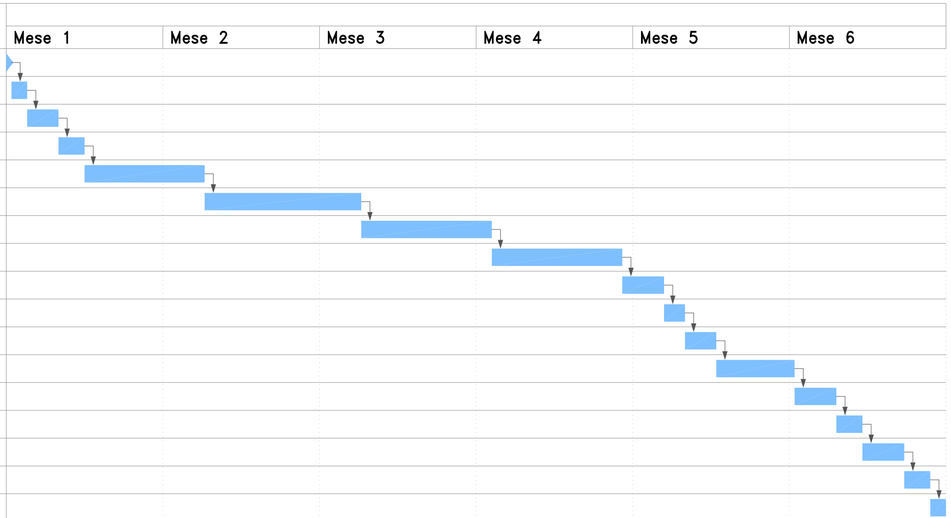

DURATA LAVORI 6 MESI
